

Chef de projet
Dates du projet

29 avr. 2019 - 4 mai 2020

Avancée
Tâches
Ressources

0%
33
10

Tâches

2

Nom	Durée	Responsable
CENTRE CULTUREL PONT A MARCQ	265	
Constat d'huissier	0	Lot01GOE-CE01 GO
OS démarrage	0	
Préparations +Si amiante:1mois plan de retrait	20	
Neutralisation des réseaux	2	Lot06-Electricité, Lot07-Plomberie-Sanitaires-CVC
Gros oeuvre	90	Lot01GOE-CE01 GO
Infrastructure	35	
Superstructure	55	
Etanchéité-zinguerie	20	Lot01GOE-CE02 Etanchéité - Zinguerie
Fabrication menuiseries aluminium	40	Lot01GOE-CE3 Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie
Commande	30	
Fabrication	10	
Pose menuiseries extérieures aluminium	15	Lot01GOE-CE3 Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie
Clos et couvert	0	
Casquette Bardage HPL	5	
Pose bardage tôle perforée	13	
Plâtrerie-cloisons-plafond	40	Lot03-Plâtrerie-faux plafonds
Cloisons	15	
Plafonds	25	
Menuiseries intérieures	10	Lot02-Menuiseries intérieures-agencement
agencement-finitions	15	Lot02-Menuiseries intérieures-agencement
Chapes-carrelage-faïences	10	lot04-Carrelage
Carrelage-Faïence	10	
Pose sols souples	25	Lot05-Sols souples-peinture
Peintures	20	Lot05-Sols souples-peinture
Electricité	245	Lot06-Electricité
Plomberie-sanitaires-CVC	245	Lot07-Plomberie-Sanitaires-CVC
VRD	255	Lot08-VRD
Plateforme	15	
Cour intérieure - enrobé	20	
Finitions	20	
Finitions-Mises en service-OPR-Commissions	20	
Réception	0	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Lot01GOE-CE01 GO	Non défini
Lot01GOE-CE02 Etanchéité - Zinguerie	Non défini
Lot01GOE-CE3 Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie	Non défini
Lot02-Menuiseries intérieures-agencement	Non défini
Lot03-Plâtrerie-faux plafonds	Non défini
lot04-Carrelage	Non défini
Lot05-Sols souples-peinture	Non défini
Lot06-Electricité	Non défini
Lot07-Plomberie-Sanitaires-CVC	Non défini
Lot08-VRD	Non défini

Diagramme de Gantt

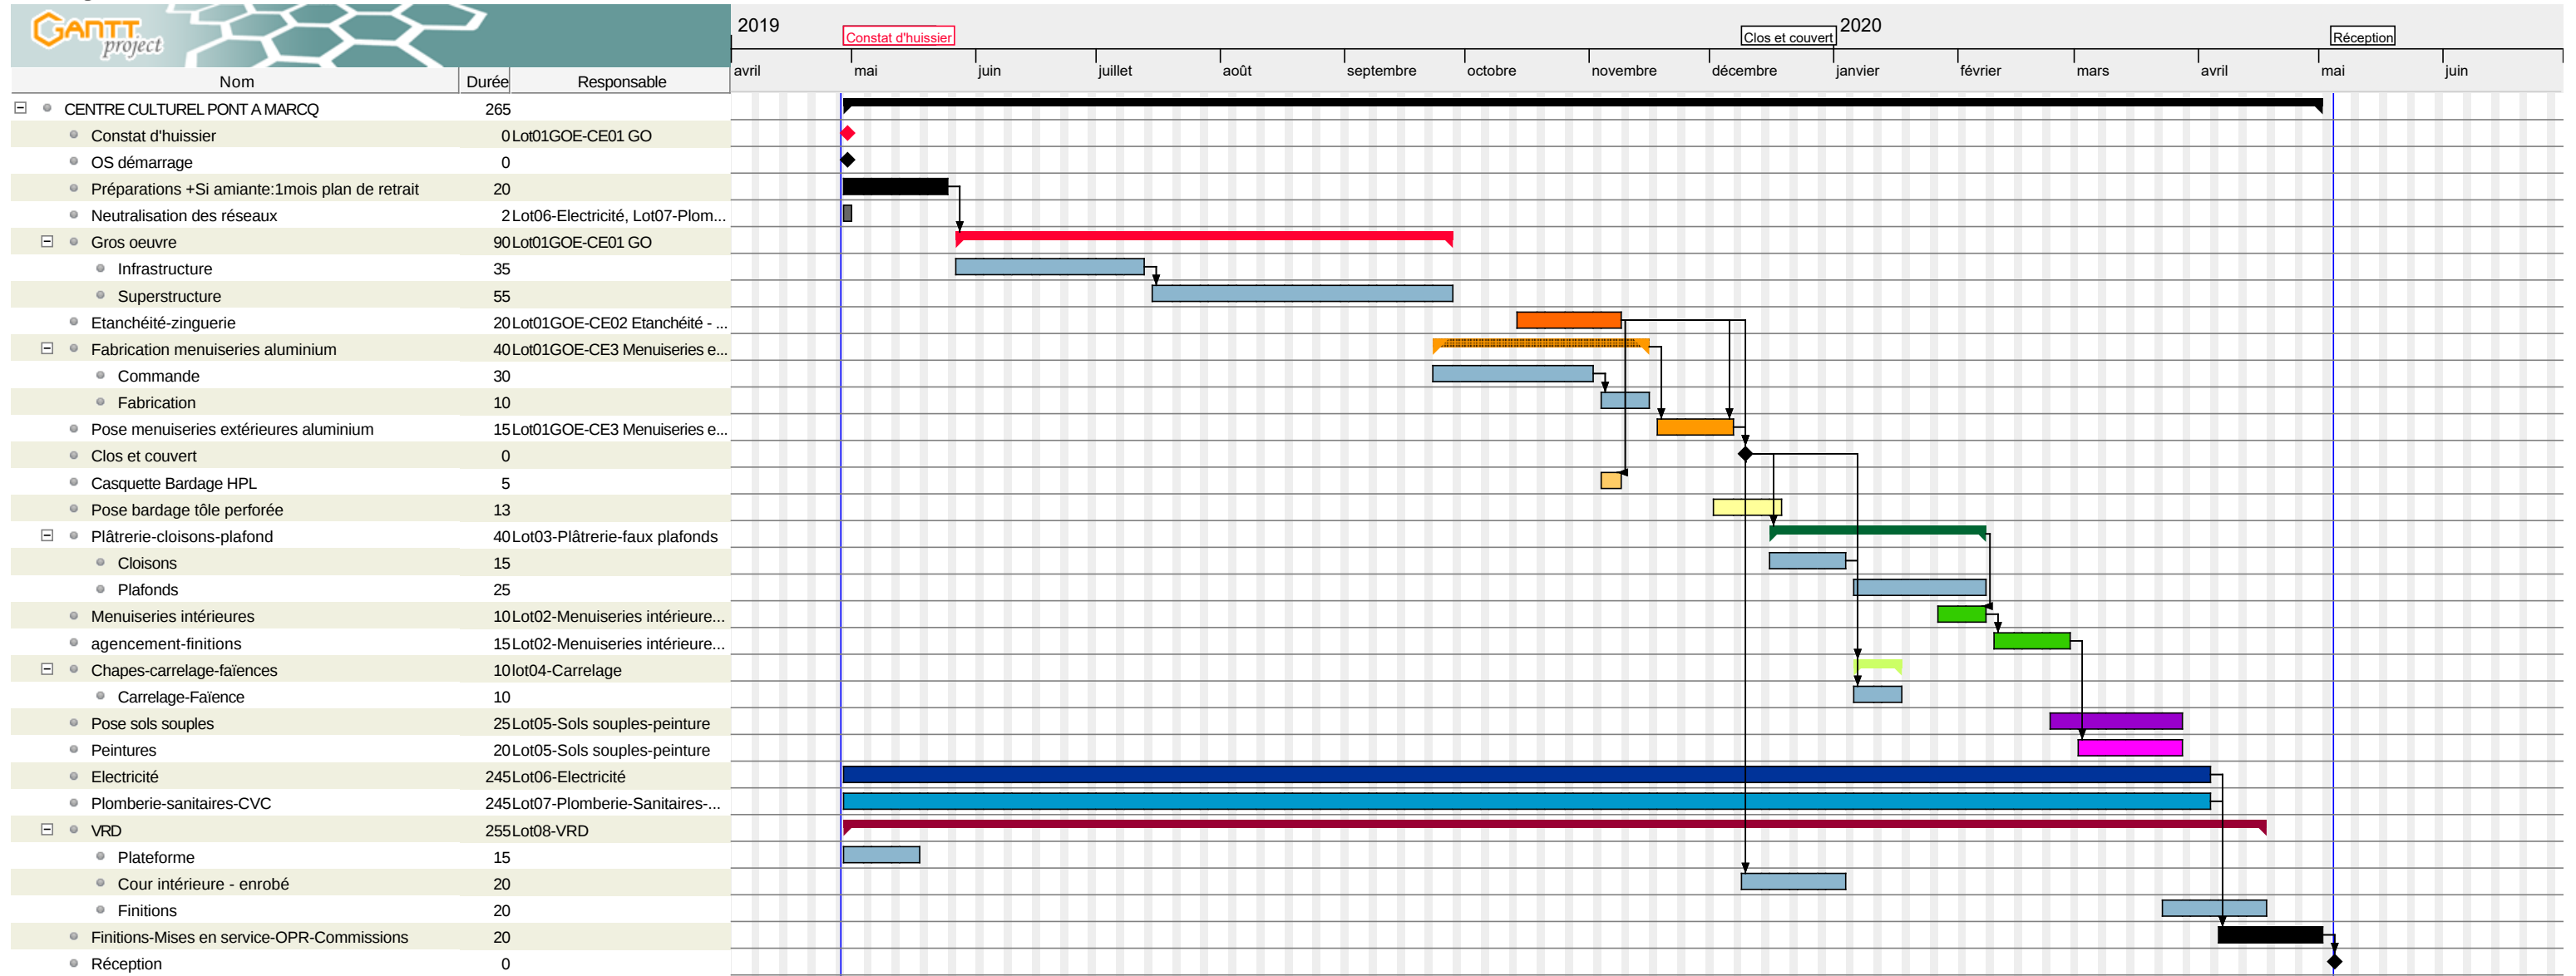


Diagramme des Ressources

